

הצהרת לקוח - עמידה בסיכום התיאום הטכני ועמידה בתנאים לסנכרון

אני/הח"מ: _____ ת.ז.ח.פ.: _____ מצהיר/ים בזאת בכתב כדלקמן:

1. בהמשך להודעת שירות מס' 301310579 אשר במסגרתה ביקשתי להקים מתקן ייצור מבוזר במסגרת אסדרה לאנרגיות מתחדשות בהספק של 270 קו"ט, (להלן: ה"מתקן") במקרקעין הידועים כחלקה 51 בגוש 2711 בכתובת **מיכללת אחווה בישוב ערוגות** כמפורט במסמכים שצורפו לבקשה לשילוב/חיבור המתקן ברשת.
2. הנני לאשר ולהצהיר כי בהתאם לסיכום הטכני שבוצע ביני לבין חברת החשמל מיום 01/06/2026 פעלתי כפי המתחייב ממני בסיכום זה והשלמתי את כל העבודות הנדרשות לצורך שילוב ו/או חיבור המתקן לרשת החלוקה של חברת החשמל.
3. הנני מצהיר בפני חברת החשמל כי פעלתי בהתאם להוראות אמות המידה, ביניהם ובפרט אמת מידה 35כ4(1) לפיה "מחלק יסנכרן מיתקן אם המבקש השלים את העבודות שהיה עליו לבצע **בהתאם לתיאום הטכני**". ידוע לי כי חברת החשמל תמשיך בקידום הטיפול וסנכרון המתקן, אך ורק בהתאם לאמור, קרי השלמת העבודות ע"פ הסיכום הטכני.

4. בכל עת שיתברר כי ההצהרה שנמסרה אינה נכונה ו/או כוזבת ו/או אינה שלמה ו/או אינה מדויקת ו/או אינה עולה בקנה אחד עם הפעולות אותן הייתי נדרש לנקוט וההסכמות אותן הייתי צריך לקבל לפי אמות המידה ו/או ע"פ חוק, הנני נותן בזאת הסכמתי לכך שחברת החשמל תהא רשאית לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, לרבות אי מתן אישור עמידה בתנאים לסנכרון ו/או אם ניתן אישור כזה – לבטלו ו/או להפסיק את תהליך שילוב ו/או חיבור המתקן לרשת ו/או לנתקו מהרשת ככל שחובר ו/או להוציא המתקן מהמכסה והאסדרה שקבעה רשות החשמל אליה נרשמתי, לרבות לפי החלטת רשות מוסמכת או ערכאה שיפוטית ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד החברה בגין האמור.

5. רשימת דרישות באחריות המבקש, בהתאם לתיאום הטכני שבוצע בתאריך 01/06/2026: (*יובהר כי הרשימה אינה רשימה סגורה).

☐ הכנות לקוח והתקנת עמוד מ"ג הכולל שנאי

☐ תחנה פנימית / חדר מיתוג

☒ הכנות לקוח (גומחות, צנרת וכו') כולל ההכנות הנדרשות עבור הגדלת החיבור

☐ הכנות לקוח לצורך התקנת ארון תקשורת


☒ אחר


נשלח מייל עם הנחיות מפורטות ואישור תכנית למזמין בתאריך 01/06/2026 עיקרי ההנחיות:

- יש לבצע את כל העבודות לפי תקנות וחוקי חוק החשמל.
- הכנות עבור כלל הגומחות ע"פ מפרטי חח"י באתר.
- יש לשמור על מרחקים מנקודות גז ומים לפחות כחצי מטר.
- לאחר הנחת כבלי חל"ב על ידי קבלן חפירות של חח"י יש להכין שביל גישה לארונות מדידה מקרקע קשה (מצע, בטון, ריצוף או אספלט)
- **במידה וזה איזור תפועלי (שעוברים רכבי עבודה) יש צורך בעמודי הגנה במרחק של 1.5 מטר לפחות מגומחה.**
- מנתקים יותקנו בגב הגומחה, גובה המנתקים יהיה 1.1-1.3 מטר, סידור נעילה ושלוט מתאימים.
- אין להתקין גדר/חומה מול האביזרים של חח"י
- יש להסיר את כלל המכשולים הבטיחותיים מאזור התקנת אביזרי חח"י (לא יהיו מכשולים במרחק הקטן מ- 3.5 מ').
- התקנת המסגרות עבור הארון מדידה לייצור ע"י יציקת בטון בלבד (לא תאושר התקנה שלא ע"פ המפרט באתר חח"י).

- ניתן לראות הנחיות מפורטות להתקנת הארון/גומחה (כולל כמות ואופן התקנת הצנרות), באתר חברת חשמל, בכתובת : <https://iec-hamaagal.co.il>
- כל הארונות יותקנו אך ורק בקומת הקרקע בכל המבנים השונים

סקיצת העמדה כללית:

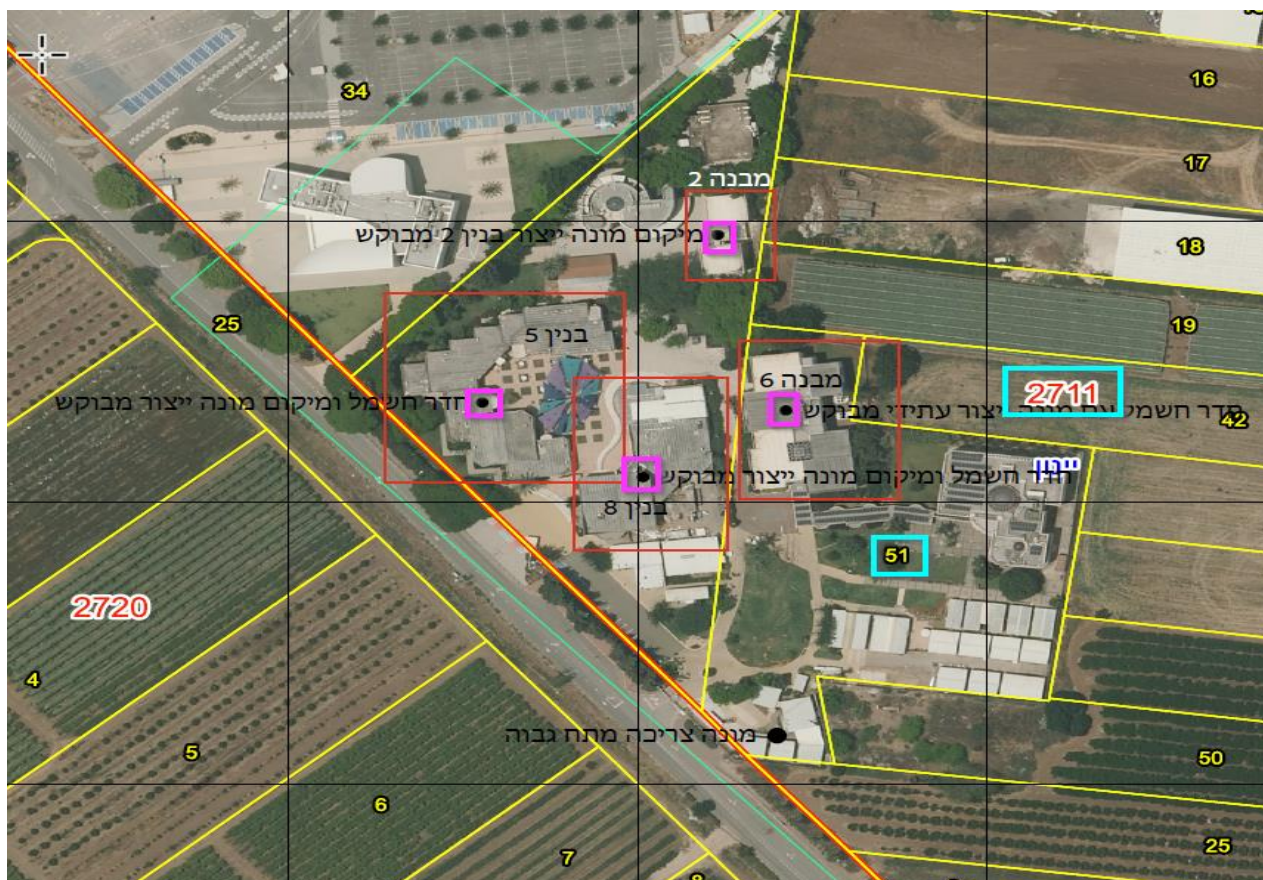

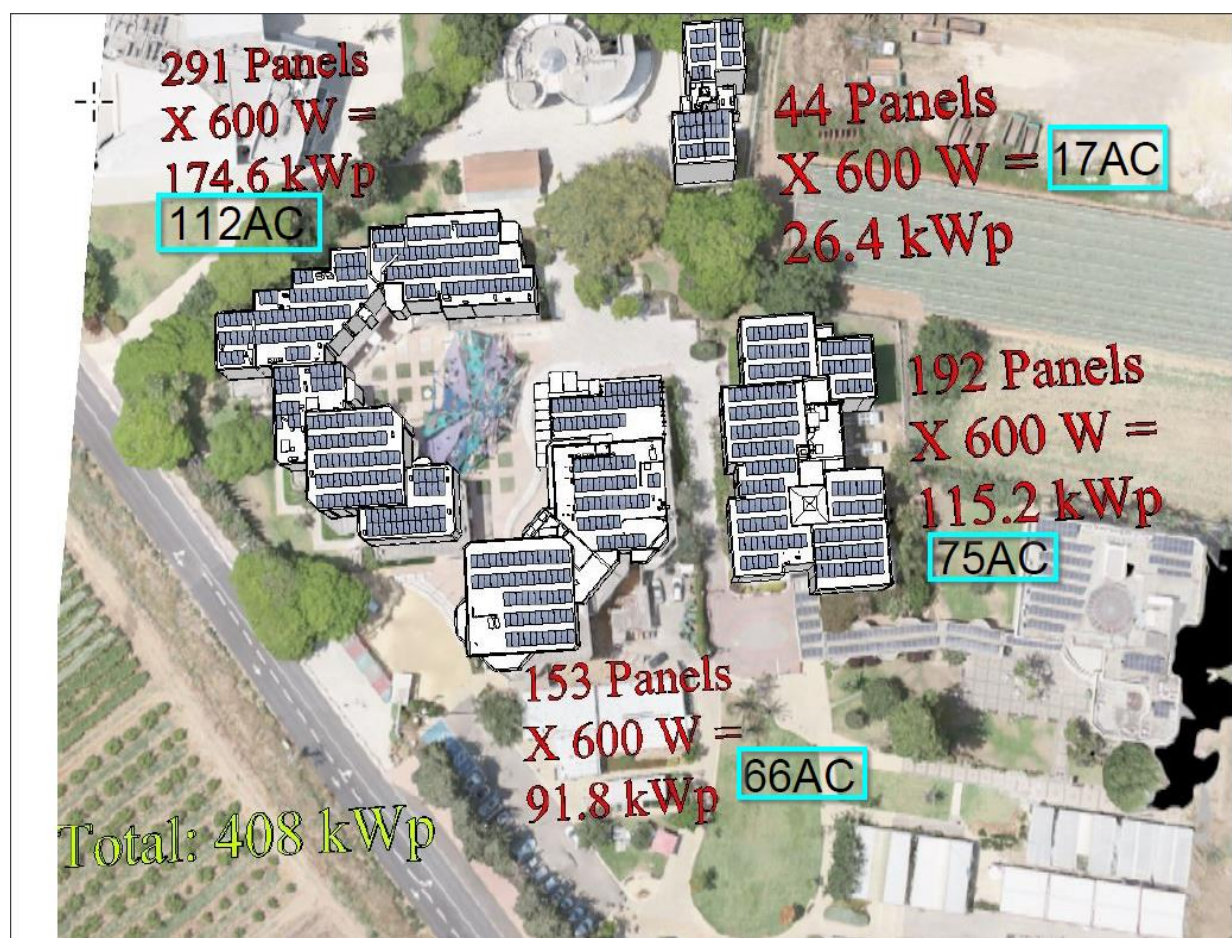

מיקום העמדת ארון ייצור בנין 8:



מיקום העמדת ארון ייצור בנין 6:



מיקום העמדת ארון ייצור בניין 5:



מיקום העמדת ארון ייצור בניין 2:



6. יצוין כי הצהרה זו אינה באה להחליף את הצורך בהמצאת המסמכים הבאים בהתאם לאמת המידה 35 כ(1)4

- היתר הפעלה שנתן המנהל למיתקן או הצהרה על עמידה בתנאי היתר סוג למיתקן המצורפים בנספח.
- הסכם רכישה חתום על ידי המבקש
- פוליסות או אישורי ביטוח התואמים את הוראות הסכם ה-PPA
- אישור להספקת חשמל לפי תקנות התכנון והבנייה
- פטור מהיתר בנייה למיתקן רלוונטי

ולראיה באתי על החתום:

חתימה
